

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร									
จัดการบ้านเมืองที่ดี									
1	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน	20,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-	-	-	✓
2	โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	20,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-	-	-	✓
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิก สภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง	450,310.00	450,310.00	18 เม.ย. 66	21 เม.ย. 66	✓	-	-	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง	30,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-	-	-	✓

ร/ด	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
5	โครงการจัดการเลือกตั้ง	30,000.00	8,996.00	25 ธ.ค.2565	25 ธ.ค.2565	√	-	-	-
6	โครงการจัดเวทีประชาคม(ไม่เบิก)	0.00	0.00	8 ม.ค. 2566	8 ม.ค. 2566	√	-	-	-
7	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	55,000.00	54,394.00	18 มี.ค.2566	18 มี.ค.2566	√	-	-	-
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>									
8	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	8,155.00	27 ก.ค. 2566	27 ก.ค. 2566	√	-	-	-
9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	70,000.00	21,990.00	10 ส.ค.2566	10 ส.ค.2566	√	-	-	-
10	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในที่สาธารณประโยชน์ตำบลหินตาด องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดนครราชสีมา	20,000.00	8,155.00	6 ส.ค.2566	6 ส.ค.2566	√	-	-	-
11	โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย	30,000.00	23,080.00	24 มี.ค.2566	24 มี.ค.2566	√	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดนครราชสีมา

ร.ก.	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน</u>									
12	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหิน ดาด	60,000.00	25,920.00	1 มิ.ย.2566	1 มิ.ย.2566	√	-	-	-
13	โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	50,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-	-	-	√
14	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำ องค์กรชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	130,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-	-	-	√
<u>ยุทธศาสตร์นโครงสร้างพื้นฐาน</u>									
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาด เหนือ หมู่ 17	295,000.00	295,000.00	1 ก.พ.2566.ย. 2566	1 เม.ย.2566	√	-	-	-
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาททอง หมู่ 22	68,000.00	67,000.00	14 มี.ค.2566	27 พ.ค.2566	√	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโคก พัฒนา หมู่ 23	99,600.00	98,000.00	3 ก.พ.2566	5 เม.ย.2566	√	-	-	-
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาโคก พัฒนา หมู่ 23	398,000.00	397,000.00	3 ก.พ.2566	5 เม.ย.2566	√	-	-	-
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่ารวก - วัง ตะเข้ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	488,000.00	488,000.00	1 เม.ย..2566	30 พ.ค.2566	√	-	-	-
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะแหวะหว่า บ้านพุนทอง หมู่ 16	493,000.00	493,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาท ทอง หมู่ 22	430,000.00	426,000.00	11 มี.ค.2566	10 พ.ค.2566	√	-	-	-
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใหญ่ บ้านรวมใจ หมู่ 15	492,000.00	492,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโตนตะคร้อ - คลองส่งน้ำห้วยปราสาทใหญ่ บ้านพุนทอง หมู่ 16	302,000.00	302,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตอนสีฟัน บ้านโนนขี้ต้อน หมู่ 9	493,000.00	493,000.00	30 มี.ค.2566	29 พ.ค.2566	√	-	-	-
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ 18	499,000.00	498,000.00	11 มี.ค.2566	10 พ.ค.2566	√	-	-	-
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากคลองส่ง น้ำสายหลักโนนประดู่ - ะยายมน บ้าน ปราสาททอง หมู่ 22	495,000.00	495,000.00	30 มี.ค.2566	29 พ.ค.2566	√	-	-	-
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าเกวียน- หนองกก บ้านหินดาด หมู่ 13	495,000.00	495,000.00	30 มี.ค.2566	29 พ.ค.2566	√	-	-	-
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยคุณทรัพย์ บ้านปราสาท หมู่ 4	323,000.00	323,000.00	16 พ.ค.2566	28 ก.ค.2566	√	-	-	-
29	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามท่อ ถึง หนองกระทุ่ม บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	309,000.00	309,000.00	2 ก.ย.2566	1 พ.ย.2566	√	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตาไ้ บ้านปราสาททอง หมู่ 22	450,000.00	450,000.00	2 ก.ย.2566	1 พ.ย.2566	√	-	-	-
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหล้า - บ้านนายเสนห์ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	54,000.00	54,000.00	16 พ.ค.2566	28 ก.ค.2566	√	-	-	-
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตะวันออก ซอย2 บ้านห้วยจรเข้มตะวันออกหมู่ 19	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมัน - บ้านนายระเบียบ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	488,000.00	488,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-
34	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสะแก - นาลาว บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	437,000.00	437,000.00	6 ก.ค.2566	3 ก.ย.2566	√	-	-	-
35	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่างหมู่ 7	499,000.00	499,000.00	11ส.ค.2566	9 ต.ค.2566	√	-	-	-
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุ เนตร - ถึงทางแยกเข้าวัดหนองยารักษ์ บ้าน หนองยารักษ์ หมู่ 24	492,000.00	492,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมยศ - บ้านนายเสก บ้านท่าซี้เหล็ก 2 หมู่ 20	241,000.00	241,000.00	19 เม.ย..2566	17 มิ.ย.2566	√	-	-	-
38	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้มหมู่ 3	485,000.00	485,000.00	23 ก.พ.2566	23 เม.ย..2566	√	-	-	-
39	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสระโบราณ - วังตะคาบ บ้านรวมใจ หมู่ 15	437,000.00	437,000.00	1 ก.ค.2566	29 ส.ค.2566	√	-	-	-
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกสะพานใหม่ บ้านโนนซี้ตื้น หมู่ 9	474,000.00	474,000.00	6 ก.ค.2566	3 ก.ย.2566	√	-	-	-
41	โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนายจรูญ - บ้านนางอ่อน บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	302,000.00	302,000.00	16 พ.ค.2566	28 ก.ค.2566	√	-	-	-
42	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองผิไม้ บ้านห้วยจรเข้มรุ่งเรือง หมู่ 18	430,000.00	430,000.00	1 ก.ค.2566	29 ส.ค.2566	√	-	-	-
43	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24 ต.หินดาด เชื่อมกับบ้านหินหล่อง ตำบลตะเคียน	457,000.00	457,000.00	6 ก.ค.2566	3 ก.ย.2566	√	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
44	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพญา หมู่ 21	494,000.00	494,000.00	11 พ.ค.2566	24 ก.ค.2566	√	-	-	-
45	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	210,000.00	210,000.00	6 ก.ค.2566	3 ก.ย.2566	√	-	-	-
46	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนบ้าน ปราสาท-ทำซีเมนต์ช่วงแยกตรงข้ามลาน อเนกประสงค์-บ้านทุ่งสว่าง บ้านทำซีเมนต์ หมู่ 2	467,000.00	467,000.00	11 ส.ค.2566	9 ต.ค.2566	√	-	-	-
47	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่ฝั่งซ้าย บ้านปราสาท หมู่ที่ 4	408,000.00	408,000.00	6 ก.ค.2566	3 ก.ย.2566	√	-	-	-
48	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระทู้ ทอง หมู่ 11	458,000.00	458,000.00	6 ก.ค.2566	3 ก.ย.2566	√	-	-	-
49	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง สมพงษ์ บ้านทำซีเมนต์ 2 หมู่ที่ 20	421,000.00	421,000.00	11 ส.ค.2566	6 ต.ค.2566	√	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
50	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นาย สมควรไปเชื่อมถนนสายนาโคกพัฒนา บ้านกุด นางทอหูก หมู่ 5	268,000.00	268,000.00	30 มี.ค.2566	29 พ.ค.2566	√	-	-	-
51	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	492,000.00	492,000.00	23 ก.พ.2566	23 เม.ย.2566	√	-	-	-
52	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาด เหนือ หมู่ 17	192,000.00	192,000.00	1 ก.พ. 2566	1 เม.ย.2566	√	-	-	-
53	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุนทอง หมู่ 16	479,000.00	479,000.00	11 มี.ค.2566	10 พ.ค.2566	√	-	-	-
54	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสำโรง เชื่อมบ้านปราสาท บ้านหินดาด หมู่ 1	488,000.00	488,000.00	30 มี.ค.2566	29 พ.ค.2566	√	-	-	-
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก2 หมู่ 20	122,000.00	121,000.00	14 มี.ค.2566	27 พ.ค.2566	√	-	-	-
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	375,000.00	374,000.00	14 มี.ค.2566	27 พ.ค.2566	√	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแดง ภูมิโคกรักษ์ ถึงวัดจันทาราม บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	498,000.00	497,000.00	22 ก.พ.2566	8 พ.ค.2566	√	-	-	-
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระพี ทอง หมู่ 11	498,000.00	497,000.00	22 ก.พ.2566	8 พ.ค.2566	√	-	-	-
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุณตา บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	109,000.00	108,000.00	2 มี.ค.2566	9 พ.ค.2566	√	-	-	-
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่ช่วย บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	65,000.00	63,000.00	2 มี.ค.2566	9 พ.ค.2566	√	-	-	-
61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดนาง ทอหูกเชื่อมบ้านปำรังงาม บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5	350,000.00	350,000.00	30 มี.ค.2566	29 พ.ค.2566	√	-	-	-
62	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้ ตะวันออก หมู่ 19	441,000.00	441,000.00	1 ก.ค.2566	29 ส.ค.2566	√	-	-	-

ร.ก.	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
63	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายศาลา ประชาคม - บ้านนายสังคม บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	97,000.00	97,000.00	16 พ.ค.2566	28 ก.ค.2566	√	-	-	-
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยง หมู่ 6	300,000.00	299,000.00	22 ก.พ.2566	8 พ.ค.2566	√			
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</u>									
65	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	5,376,000.00	4,288,400.0 0	1 ต.ค.2565-	30 ก.ย.2566	√			
66	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังยา และพื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	190,000.00	107,097.50	20 ก.ย.2566	20 ก.ย.2566	√			
67	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	240,000.00	171,000.00	1 ต.ค.2565-	30 ก.ย.2566	√			
68	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	1,692,600.00	1,692,284.0 0	1 ต.ค.2565-	30 ก.ย.2566	√			

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
69	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย	60,000.00	32,600.00	17 ส.ค. 2566	18 ส.ค. 2566	✓			
70	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000.00	4,915.00	25 พ.ค. 2566	25 พ.ค. 2566	✓			
71	โครงการจัดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง	50,000.00	49,970.00	25 พ.ย. 2565	25 พ.ย. 2565	✓			
72	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	50,000.00	36,120.00	13 เม.ย.2566	13 เม.ย.2566	✓			
73	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	280,000.00	280,000.00	2 ธ.ค.2565	4 ธ.ค.2565	✓			
74	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด	35,000.00	35,000.00	16 ส.ค. 2566	16 ส.ค. 2566	✓			
75	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงาน จ้าง	10,000.00	5,270.00	21 มิ.ย.2566	21 มิ.ย.2566	✓			
76	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-			✓


ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
77	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	60,000.00	28,160.00	18ก.ค. 2566	18ก.ค. 2566				
78	โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	50,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ		-			✓
79	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท	25,000.00	25,000.00	23 ส.ค.2566	23 ส.ค.2566	✓			
80	อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยง	29,500.00	29,500.00	23 ส.ค.2566	23 ส.ค.2566	✓			
81	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	3,780,000.00	3,734,850.	3 พ.ค.2566	3 พ.ค.2566	✓			
82	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	23,236,800.00	20,371,000. 00	1 ต.ค.2565	30 ก.ย.2566	✓			
83	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	450,000.00	320,245.00	23 ส.ค.2566	25 ส.ค.2566	✓			
84	โครงการส่งเสริมการดำเนินการและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	60,000.00	19,780.00	23 ธ.ค. 2565	23 ธ.ค. 2565	✓			

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
85	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าซี้เหล็ก	25,000.00	25,000.00	23 ส.ค.2566	23 ส.ค.2566	✓			
86	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอง	29,500.00	29,500.00	23 ส.ค.2566	23 ส.ค.2566	✓			
87	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ม	35,000.00	35,000.00	23 ส.ค.2566	23 ส.ค.2566	✓			
88	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	58,258.00	13 ม.ค. 2566	13 ม.ค. 2566	✓			
89	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	20,000.00	20,000.00	23 พ.ค.2566	23 พ.ค.2566	✓			
90	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	22,000.00	21,910.00	29 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66	✓			
91	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000.00	24,370.00	11 เม.ย. 2566	17 เม.ย 2566	✓			
92	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	0.00	0.00	ไม่ดำเนินการ					✓


ร.ก.	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				ว ด ป ที่เริ่ม	ว ด ป ที่ สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
93	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	480,000.00	0.00	ไม่ดำเนินการ					✓
94	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค.2565	30 ก.ย.2566	✓			
95	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	130,000.00	109,241.00	21 ก.ค.2566	21 ก.ค.2566	✓			

อบต.หินดาด ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ และการใช้จ่ายเงินสะสม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเพิ่มเติม แสดงเป็นกราฟเปรียบเทียบได้ดังนี้

กราฟแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแยกรายยุทธศาสตร์

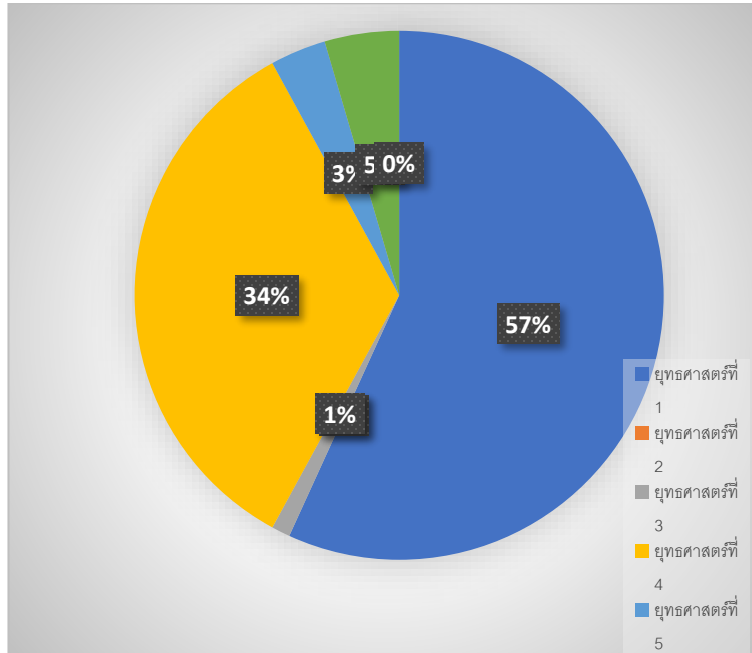

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแยกรายยุทธศาสตร์

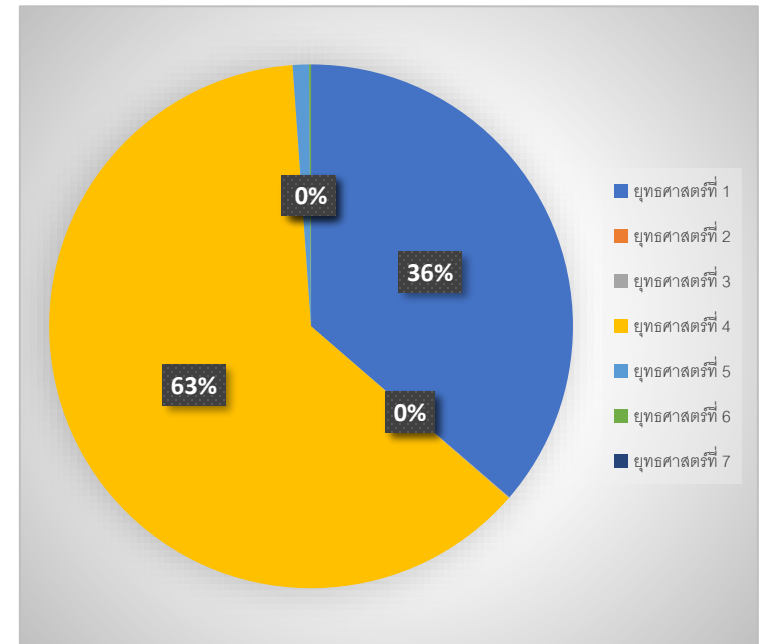

การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากกราฟแสดงผลการดำเนินงานจะเห็นว่า

๑.โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ หากเปรียบเทียบจำนวนโครงการ จะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๕๗% ของจำนวนโครงการ ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ไม่มีการดำเนินการ คิดเป็น ๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ดำเนินการ ๑%ของจำนวนโครงการ ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ ๓๔% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการ ๓% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ๕% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีโครงการที่ ดำเนินการ คิดเป็น ๐ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๒.งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๕๑,๑๖๕,๒๑๑.๕๐ บาท หากเปรียบเทียบ จำนวนงบประมาณจะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีงบประมาณที่ดำเนินการ ๓๖% ของ จำนวนงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ไม่มีการดำเนินการ คิดเป็น ๐% ของ งบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณที่ ดำเนินการ ๑% ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ ๖๓% ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการ ๑% ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ๑% ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็น ๐ % ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

/(๔)ปัญหา...

(๔) ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการพิจารณาโครงการที่ดำเนินการและไม่ดำเนินการ จะเห็นว่ามีบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณเนื่องจากมีงบประมาณจากส่วนกลางเข้ามาล่าช้า เช่นโครงการพระราชดำริสาธารณสุขทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่วางเป้าหมายไว้ได้ นอกจากนี้โครงการบางโครงการมีลักษณะเนื้องานคล้ายกันทำให้จำเป็นต้องดำเนินการเพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง

(๕) ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณา ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ในการพิจารณาโครงการในปีงบประมาณถัดไปเห็นควรพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางที่เข้ามาล่าช้าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันในห้วงปีงบประมาณอาจจะใช้วิธียืมเงินงบประมาณใช้ไปพลางก่อนโดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบการเงินการคลัง
๒. โครงการที่มีลักษณะงานที่คล้ายกันเห็นควรรวบรวมเป็นโครงการเดียวกันโดยอาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความกระชับมากยิ่งขึ้น
